ZEO AG
INGENIEURBÜRO

212030 Reservoir Schluchen (1951), Emmenbrücke
Instandstellung 2022

Generelles Terminprogramm Realisierung

Stand: 07.01.2022
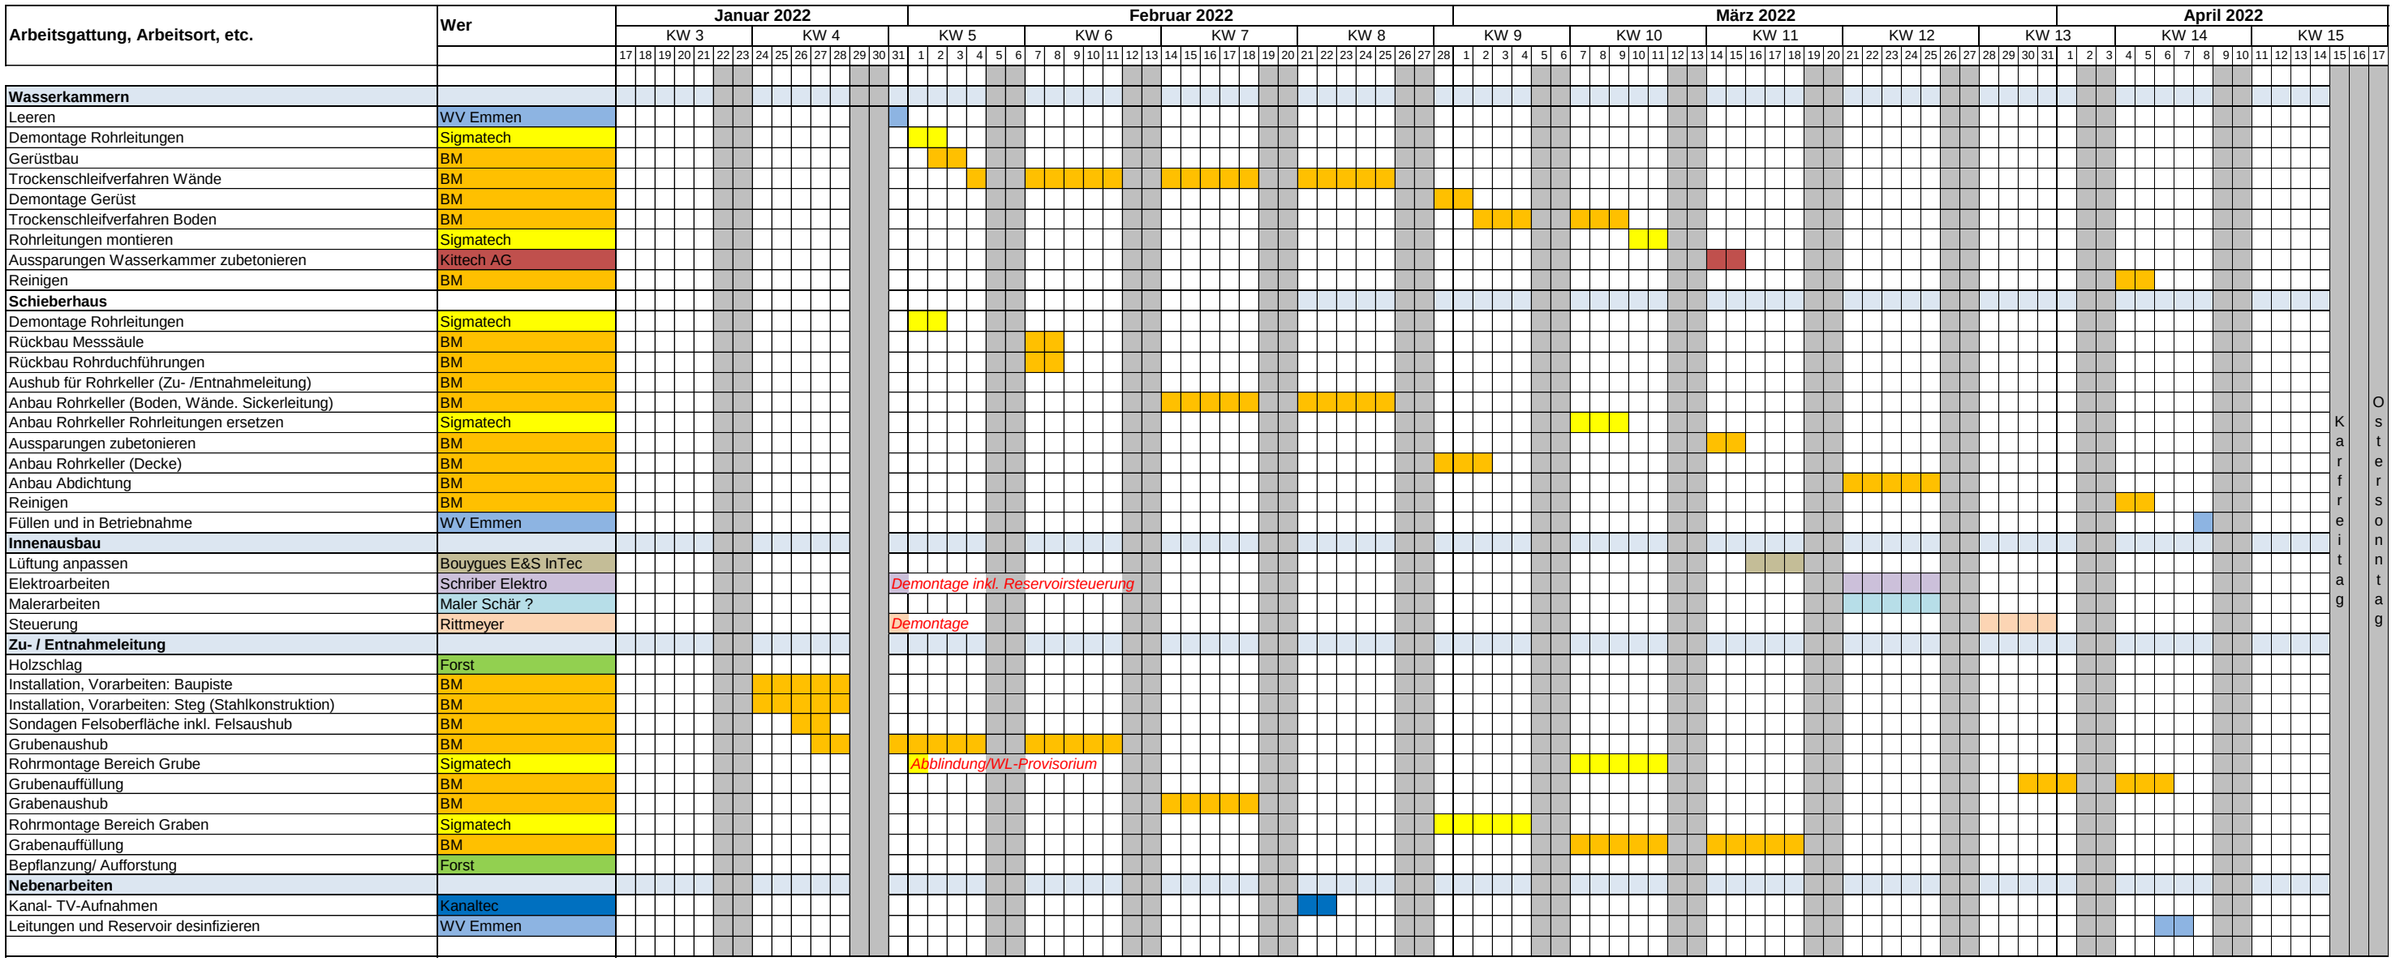
Arbeitsgattung, Arbeitsort, etc.	Wer
Wasserkammern	
Leeren	WV Emmen
Demontage Rohrleitungen	Sigmatech
Gerüstbau	BM
Trockenschleifverfahren Wände	BM
Demontage Gerüst	BM
Trockenschleifverfahren Boden	BM
Rohrleitungen montieren	Sigmatech
Aussparungen Wasserkammer zubetonieren	Kittech AG
Reinigen	BM
Schieberhaus	
Demontage Rohrleitungen	Sigmatech
Rückbau Messsäule	BM
Rückbau Rohrduchführungen	BM
Aushub für Rohrkeller (Zu- /Entnahmeleitung)	BM
Anbau Rohrkeller (Boden, Wände. Sickerleitung)	BM
Anbau Rohrkeller Rohrleitungen ersetzen	Sigmatech
Aussparungen zubetonieren	BM
Anbau Rohrkeller (Decke)	BM
Anbau Abdichtung	BM
Reinigen	BM
Füllen und in Betriebnahme	WV Emmen
Innenausbau	
Lüftung anpassen	Bouygues E&S InTec
Elektroarbeiten	Schriber Elektro
Malerarbeiten	Maler Schär ?
Steuerung	Rittmeyer
Zu- / Entnahmeleitung	
Holzschlag	Forst
Installation, Vorarbeiten: Baupiste	BM
Installation, Vorarbeiten: Steg (Stahlkonstruktion)	BM
Sondagen Felsoberfläche inkl. Felsaushub	BM
Grubenaushub	BM
Rohrmontage Bereich Grube	Sigmatech
Grubenauffüllung	BM
Grabenaushub	BM
Rohrmontage Bereich Graben	Sigmatech
Grabenauffüllung	BM
Bepflanzung/ Aufforstung	Forst
Nebenarbeiten	
Kanal- TV-Aufnahmen	Kanaltec
Leitungen und Reservoir desinfizieren	WV Emmen
