BRIGGER + KÄCH BAUINGENIEURE AG **Objekt Nr. 2183**

Bauherr: Wasserversorgung Emmen / CKW AG
Objekt: Leitungsarbeiten CKW Hohrütistrasse
Terminprogramm vom: 24.05.2023
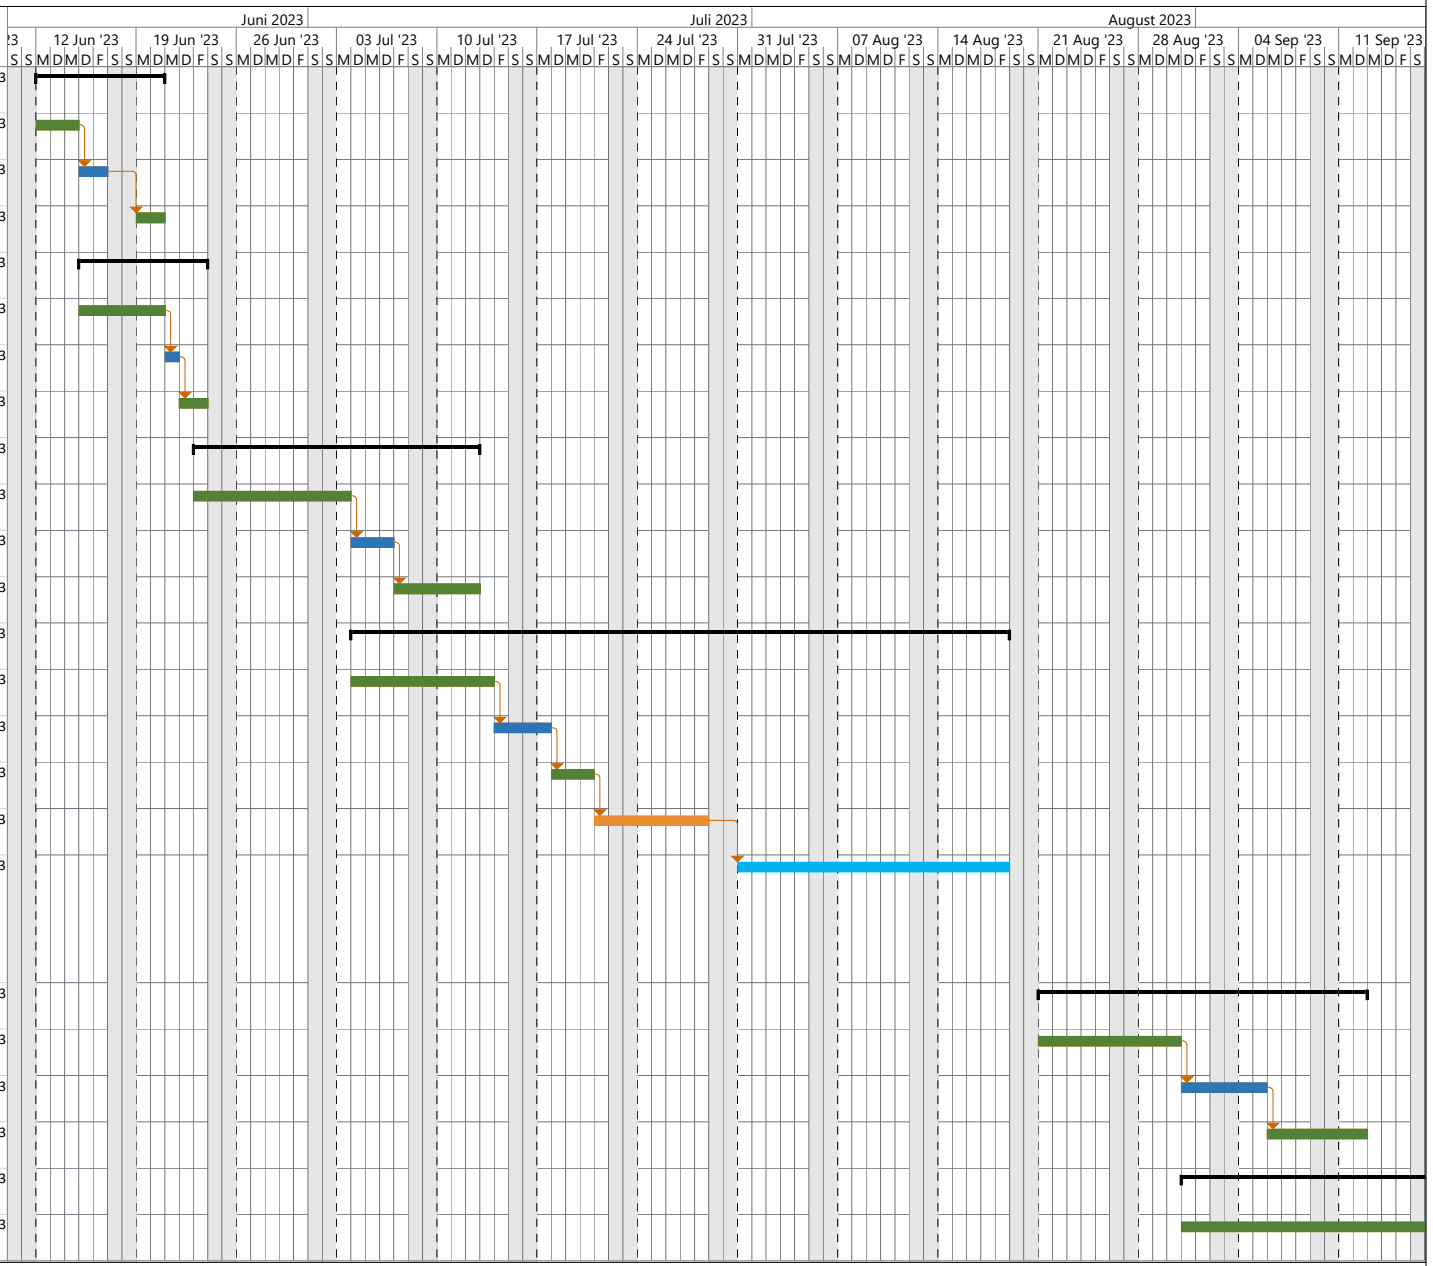
Nr.	Arbeit	Unternehmer	Dauer	Anfang	Ende
1	**1. Etappe**		7 Tage	Mon 12.06.23	Die 20.06.23
2	Graben öffnen	Amrein	3 Tage	Mon 12.06.23	Mit 14.06.23
3	Sanitär	Blank	2 Tage	Don 15.06.23	Fre 16.06.23
4	Graben schliessen	Amrein	2 Tage	Mon 19.06.23	Die 20.06.23
5	**2. Etappe**		7 Tage	Don 15.06.23	Fre 23.06.23
6	Graben öffnen	Amrein	4 Tage	Don 15.06.23	Die 20.06.23
7	Sanitär	Blank	1 Tag	Mit 21.06.23	Mit 21.06.23
8	Graben schliessen	Amrein	2 Tage	Don 22.06.23	Fre 23.06.23
9	**3. Etappe**		14 Tage	Fre 23.06.23	Mit 12.07.23
10	Graben öffnen	Amrein	7 Tage	Fre 23.06.23	Mon 03.07.23
11	Sanitär	Blank	3 Tage	Die 04.07.23	Don 06.07.23
12	Graben schliessen	Amrein	4 Tage	Fre 07.07.23	Mit 12.07.23
13	**4. Etappe**		34 Tage	Die 04.07.23	Fre 18.08.23
14	Graben öffnen	Amrein	8 Tage	Die 04.07.23	Don 13.07.23
15	Sanitär	Blank	2 Tage	Fre 14.07.23	Mon 17.07.23
16	Graben schliessen	Amrein	3 Tage	Die 18.07.23	Don 20.07.23
17	Div. Arbeiten für Private	Amrein	6 Tage	Fre 21.07.23	Fre 28.07.23
18	**FERIEN AMREIN**		15 Tage	Mon 31.07.23	Fre 18.08.23
19	**5. Etappe**		17 Tage	Mon 21.08.23	Die 12.09.23
20	Graben öffnen	Amrein	8 Tage	Mon 21.08.23	Mit 30.08.23
21	Sanitär	Blank	4 Tage	Don 31.08.23	Die 05.09.23
22	Graben schliessen	Amrein	5 Tage	Mit 06.09.23	Die 12.09.23
23	**6. Etappe**		15 Tage	Don 31.08.23	Mit 20.09.23
24	Belag	Amrein	15 Tage	Don 31.08.23	Mit 20.09.23
